

**ПРОЕКТ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
(создание лесных культур)
на весну, осень 2020г.**

Лесничество: Лодейнопольское

Участковое лесничество: Ребовское

№ квартала: 44 № выдела: 7,8

Главная порода: ель


Вид культур: сплошные (сплошные, подпологовые, реконструкция)

Арендатор лесного участка ООО «Свирьлес», дог. ар. №2-2008-12-70-3 от 09.12.2008 л/д №1-2018 от 02.11.2017

(наименование, № дог. аренды, декларация, дата)

Площадь участка: 5,6/5,2 (в7-4.2, в8-1.0)

План участка, масштаб 1:10 000

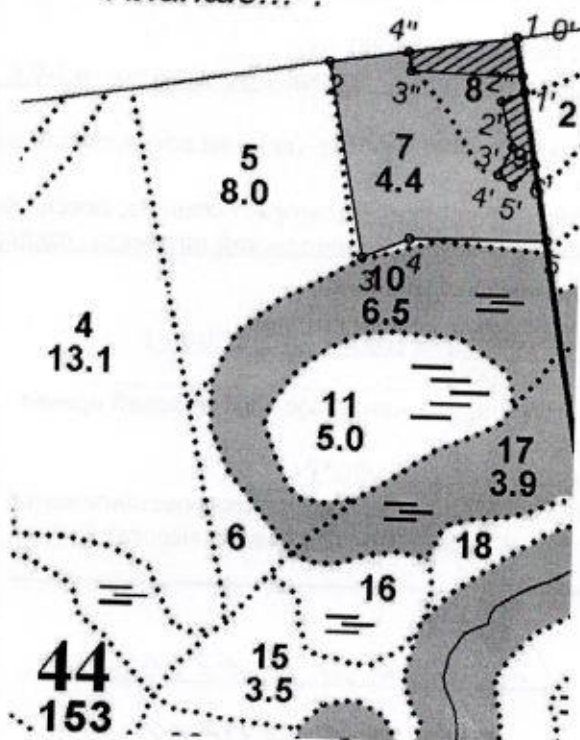

Площадь эксплуатационная, га		
5.2		
Номера точек	Румбы линий, °	Длина линий, м
Лесосека		
Номера точек	Румбы линий, °	Длина линий, м
1 - 2	ЮЗ 70°.00'	242.0
2 - 3	ЮВ 22°.00'	255.0
3 - 4	СВ 56°.00'	65.0
4 - 5	СВ 78°.00'	177.0
5 - 6	СЗ 21°.00'	264.0
Номера точек	Румбы линий, °	Длина линий, м
Привязка		
0' - 1'	ЮВ 21°.00'	70.0
Н.Э		
Номера точек	Румбы линий, °	Длина линий, м
1' - 2'	ЮЗ 55°.00'	32.0
2' - 3'	ЮВ 26°.00'	60.0
3' - 4'	ЮЗ 14°.00'	40.0
4' - 5'	ЮВ 65°.00'	23.0
5' - 6'	СВ 34°.00'	40.0
6' - 7'	СЗ 21°.00'	94.0
Номера точек	Румбы линий, °	Длина линий, м
Площадь под ест. восстановление		
Номера точек	Румбы линий, °	Длина линий, м
1" - 2"	ЮВ 21°.00'	50.0
2" - 3"	ЮЗ 80°.00'	143.0
3" - 4"	СЗ 20°.00'	25.0
4" - 1"	СВ 70°.00'	140.0

1. Категория лесокультурной площади: вырубка 2018г. состояние очистки удовлетворительное, кол-во пней (валунов) на 1 га до 600 шт., гарь -- г.; редины, пустошь, прогалины и т.д. ---
2. Рельеф, почвы, механический состав, степень влажности: равнинный, среднеподзолистые, влажные.
3. Напочвенный покров (важнейшие растения-индикаторы): травяной, средняя степень задернения 0,4-0,6
4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий: КС В2, ЧВ В3
5. Наличие естественного возобновления (по породам), тыс. шт./га; размещение, средняя высота, м: не имеется
6. Зараженность почвы вредителями, вид: в связи с отсутствием признаков заселения вредных организмов, обследование на лесном участке не проводилось.
7. Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого насаждения: не проектируется
8. Способ реконструкции: ширина и направление коридоров, кулис, площадь расчищенных коридоров от общей площади реконструируемого участка (в %): не проектируется
9. Сроки и виды подготовки площади, применяемые машины и орудия 3 квартал 2019г - подготовка почвы, бороздами, трактор ТДТ-55 с плугом ПЛ-1
10. Способы и время обработки почвы (механизированная, ручная, сплошная, полосами, бороздами, площадками и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия механизированная, бороздами, ТДТ-55, ПЛ-1, 3 квартал 2019г.
11. Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их направление борозды через 4-6м
12. Метод и способ создания культур (посадка сеянцами, саженцами, посев рядовой, строчно-луночный, ручной, механизированный) ручная посадка сеянцев под меч Колесова, в 2отвала в шахматном порядке
13. Количество посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс. шт.: 3000 шт.
14. Размещение посадочных (посевных) мест, расстояние между рядами 4-6м., в рядах 0,5-0,6 м.
15. Схема смешения пород: Е-Е-Е
16. Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га: 3000 шт. (кг) и на всю площадь по породам: 15600 шт.
17. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст сеянцев, саженцев сеянцы 3-4х лет, класс качества семян, их происхождение: Лодейнопольский питомник, паспорт.
18. Способ подготовки семян к посеву
19. Виды и способы уходов, их кратность: окашивание травы 1год-1, 2год-1, 3год-1
20. Виды и способы лесоводственных уходов, их кратность: ---
21. Противопожарные мероприятия, протяженность, ширина мин полос -соблюдений правил п/пожарной безопасности в лесу при пр-ве л/х работ.
22. Намечаемый год перевода культур в лесопокрытую площадь: 2028 г
23. Показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению выполненными (возраст, количество деревьев главных лесных пород, средняя высота): Е-9лет, Н-0,7, не менее 2,0г. шт. на га.

Составил: инженер Репкин Д.С.
(должность) (Ф.И.О.)

СР « 01 » 07.19г.

Проверил: лесничий Кабанов А.А.
(должность) (Ф.И.О.)

КА « 01 » 07.19

Согласовано с внесением следующих замечаний, инженер по лесовосстановлению

Степанович А.А. СФ по факту создания с/к внести дополнения в п. 17

Главный лесничий: Леонтьев В.Н.
(должность) (Ф.И.О.)

Л « 07 » 10.19г.
